



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

**Contratação de empresa especializada para modernização do
equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do
Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA**

RELATÓRIO: mai/25



Dados Gerais do Contrato



Unidade.: FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Obra.....: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do

Empresa.: Metalúrgica Ascurra Ltda

CONTRATO INICIAL

CONTRATO Nº.....: 190/2024

PROCESSO Nº.....: 01-P-20898/2024

VALOR CONTRATO INICIAL.....: R\$ 262.200,00

Mão-de-Obra.....: R\$ 209.485,97

Materiais.....: R\$ 52.714,03

RECURSOS:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:

Verba Orçamentária 3339-81 (Funcional Programática: 12.0364.1043.1151)

Verba Extra-Orçamentária ----

DATA INICIAL DE CONTRATO.....: 11/12/2024

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS): 510

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).....: 150

DATA DE INÍCIO DA OBRA.....: 12/12/2024

DATA DO TÉRMINO DA OBRA.....: 11/05/2025

VIGÊNCIA CONTRATUAL.....: 06/05/2026 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES 12 dias

TÉRMINO DA OBRA.....: 25/04/2025

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:

Supressão:

Aditamento:


VALOR TOTAL DO CONTRATO.....: **R\$ 262.200,00**



Obra.....: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical **V. CONTRATO:** R\$ 262.200,00


Empresa.: Metalúrgica Ascurra Ltda **V. CONT. REV.:** R\$ 262.200,00

FATURAMENTO PREVISTO X REALIZADO

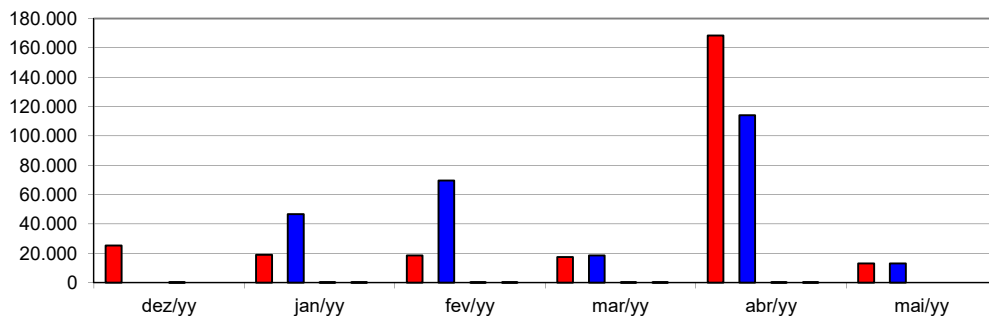

	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
Previsto	25.428,52	19.018,92	18.607,23	17.471,55	168.482,60	13.191,19
Previsto Revisado						
Realizado	0,00	46.639,57	69.612,19	18.636,20	114.110,26	13.201,78
Realizado Revisado						
Previsto	9,70%	7,25%	7,10%	6,66%	64,26%	5,03%
Previsto Revisado						
Realizado	0,00%	17,79%	26,55%	7,11%	43,52%	5,04%
Realizado Revisado						

FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO X REALIZADO

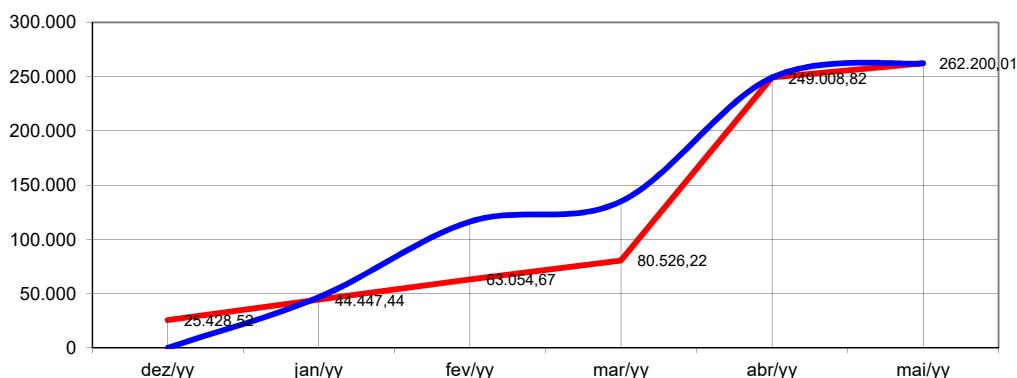

	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25
Previsto	25.428,52	44.447,44	63.054,67	80.526,22	249.008,82	262.200,01
Previsto Revisado						
Realizado	0,00	46.639,57	116.251,76	134.887,96	248.998,22	262.200,00
Realizado Revisado						
Previsto	9,70%	16,95%	24,05%	30,71%	94,97%	100,00%
Previsto Revisado						
Realizado	0,00%	17,79%	44,34%	51,44%	94,96%	100,00%
Realizado Revisado						

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE DENTRO DO PRAZO, MEDIÇÃO DE MAIO/2025 É REFERENTE A PREVENTIVA DO ELEVADOR.



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

OBRA.....: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA.: Metalúrgica Ascurra Ltda

ITEM	MOTIVOS	DIAS	%	RESPONSÁVEL	DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	INOPERÂNCIA CONTRATADA	0	0%	Empresa	11/05/2025
2)	MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE	0	0%	UNIDADE	
3)	DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	0	0%	Empresa	
4)	INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)	0	0%	CHUVAS	
5)	CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	0	0%	UNICAMP	
6)	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS	12	100%	UNICAMP	
7)	OUTROS - INFILTRAÇÕES DE CHUVA - RESP. UNICAMP	0	0%	UNICAMP	
	DIAS DE INTERCORRÊNCIAS	12	100%		

ITEM	ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO	DIAS	ACUM.	RESPONSÁVEL	NOVA DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)		0	0%		11/05/2025
2)					
3)					
TOTAL ADITAMENTOS		0	0%		

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO		0	OBRA CONCLUÍDA EM:	25/04/2025
--------------------------------	--	---	--------------------	------------



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTOS DA CONCLUSÃO DA OBRA

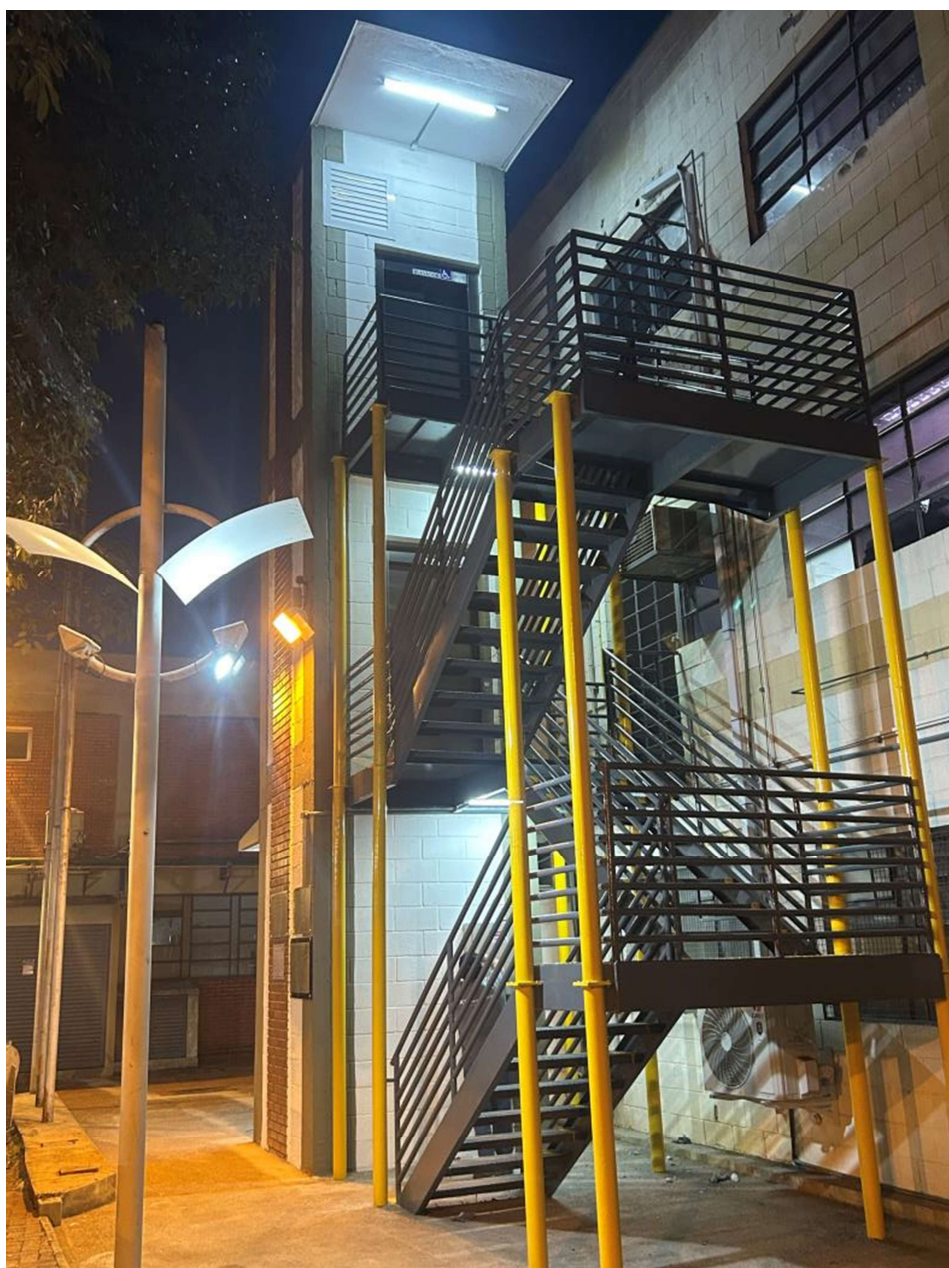



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTOS DA CONCLUSÃO DA OBRA





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTOS DA CONCLUSÃO DA OBRA





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTOS DA CONCLUSÃO DA OBRA





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTOS DA CONCLUSÃO DA OBRA





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DA OBRA

MONTAGEM DO ELEVADOR - INTERIOR DA CAIXA DO ELEVADOR





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

MONTAGEM DO ELEVADOR - INTERIOR DA CAIXA DO ELEVADOR





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

MONTAGEM DO ELEVADOR - INTERIOR DA CAIXA DO ELEVADOR

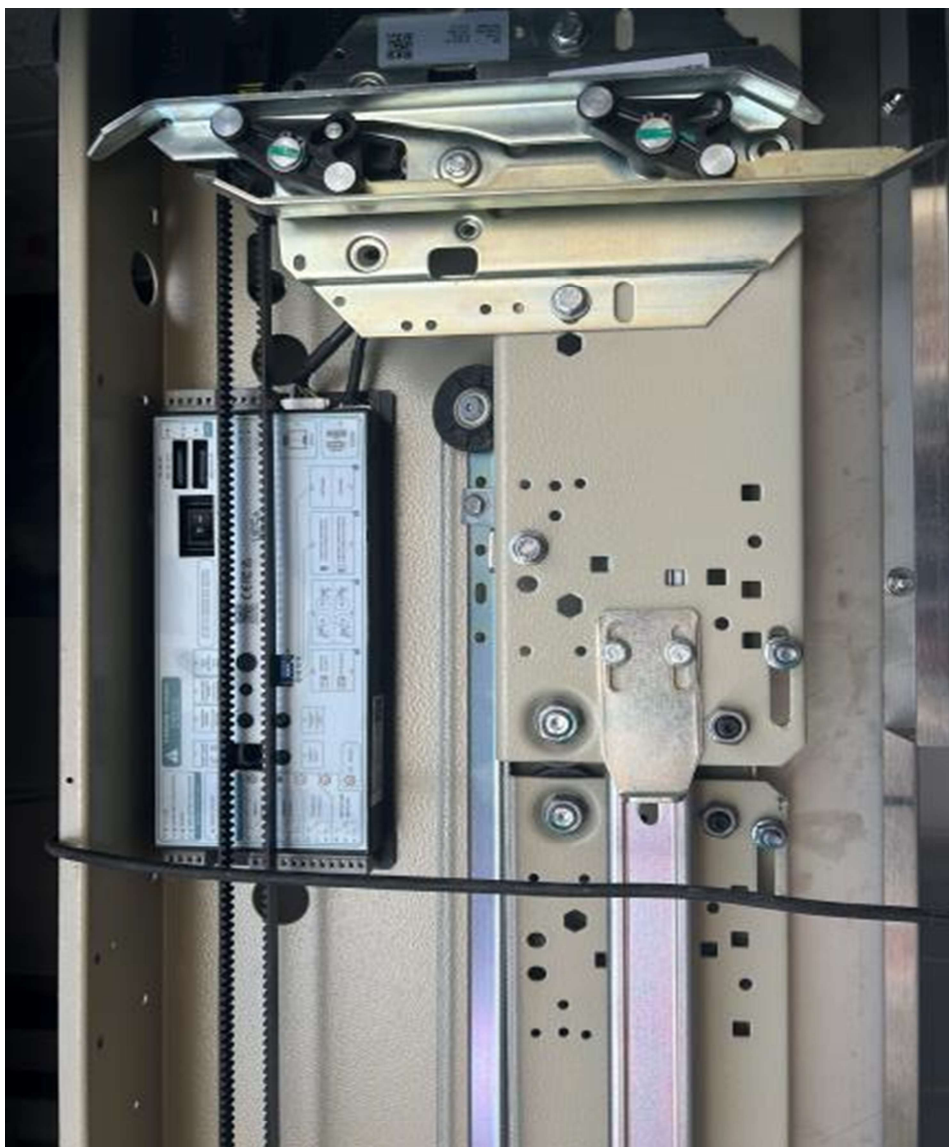



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - QGBT





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

DETALHES DE MONTAGEM





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CIVIS (TRATAMENTO E PINTURA) E DAS INFRAESTRUTURAS

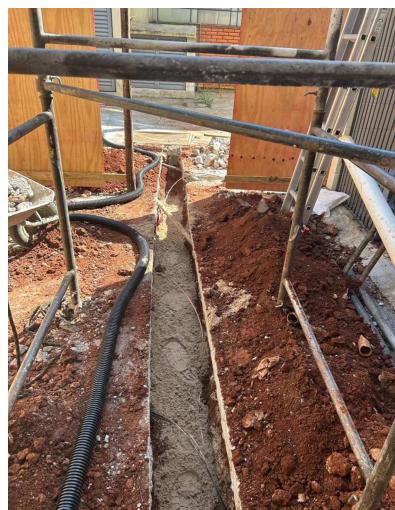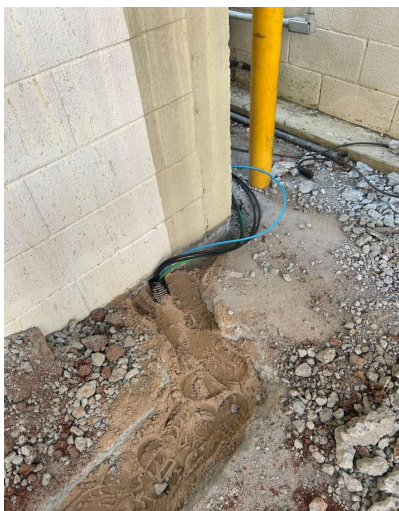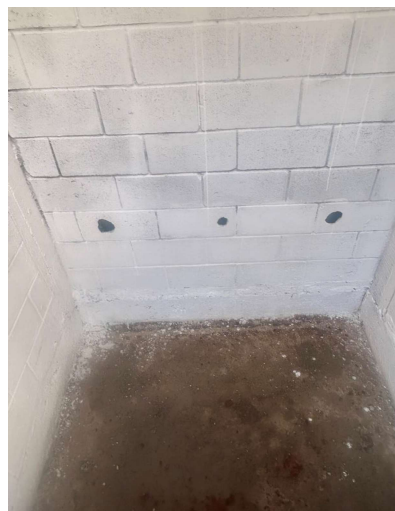



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTOS DA CONCLUSÃO DA OBRA

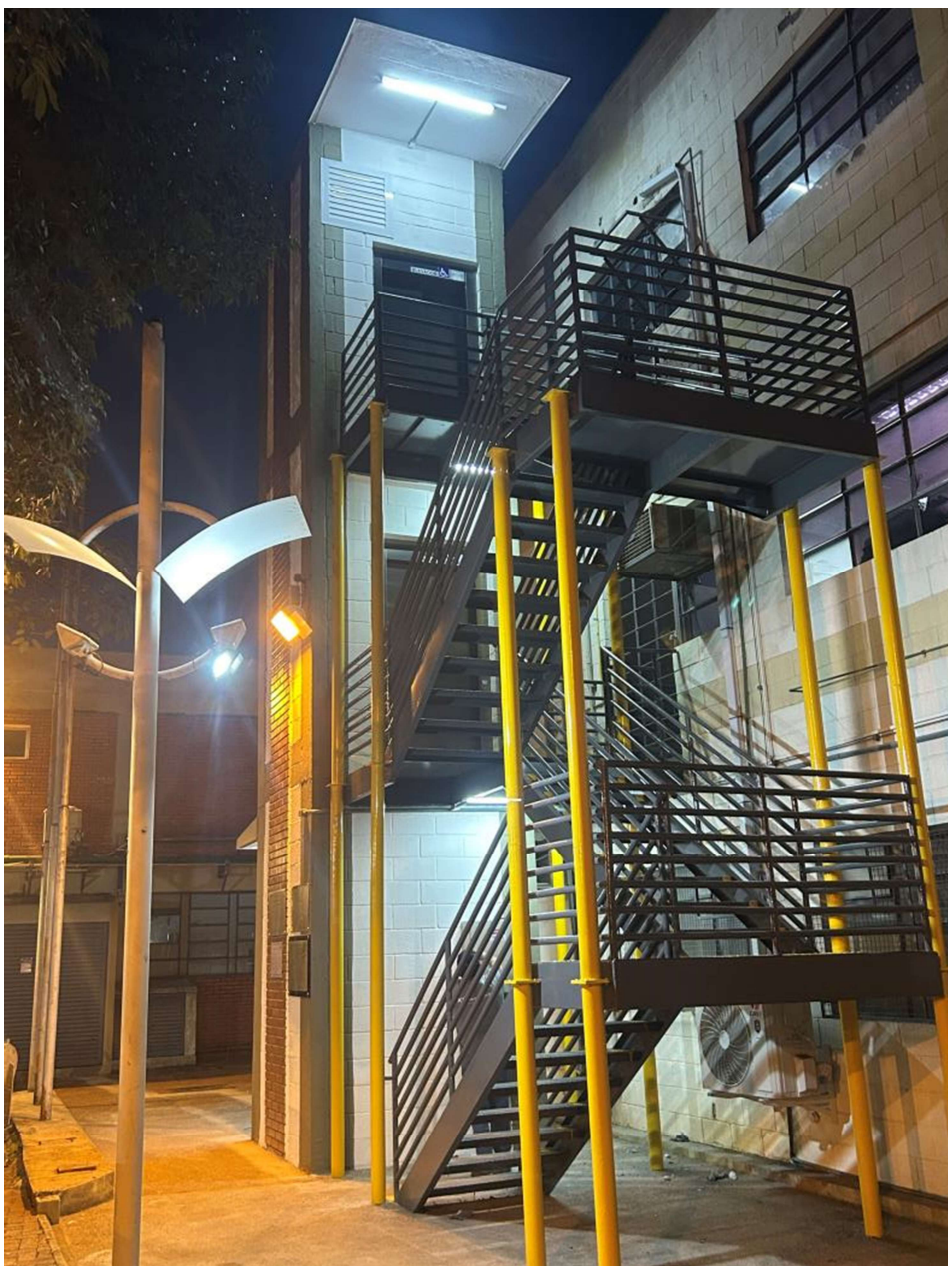



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTOS DA CONCLUSÃO DA OBRA





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTOS DA CONCLUSÃO DA OBRA





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTOS DA CONCLUSÃO DA OBRA





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTOS DA CONCLUSÃO DA OBRA





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

FOTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DA OBRA

MONTAGEM DO ELEVADOR - INTERIOR DA CAIXA DO ELEVADOR





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

MONTAGEM DO ELEVADOR - INTERIOR DA CAIXA DO ELEVADOR





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

MONTAGEM DO ELEVADOR - INTERIOR DA CAIXA DO ELEVADOR

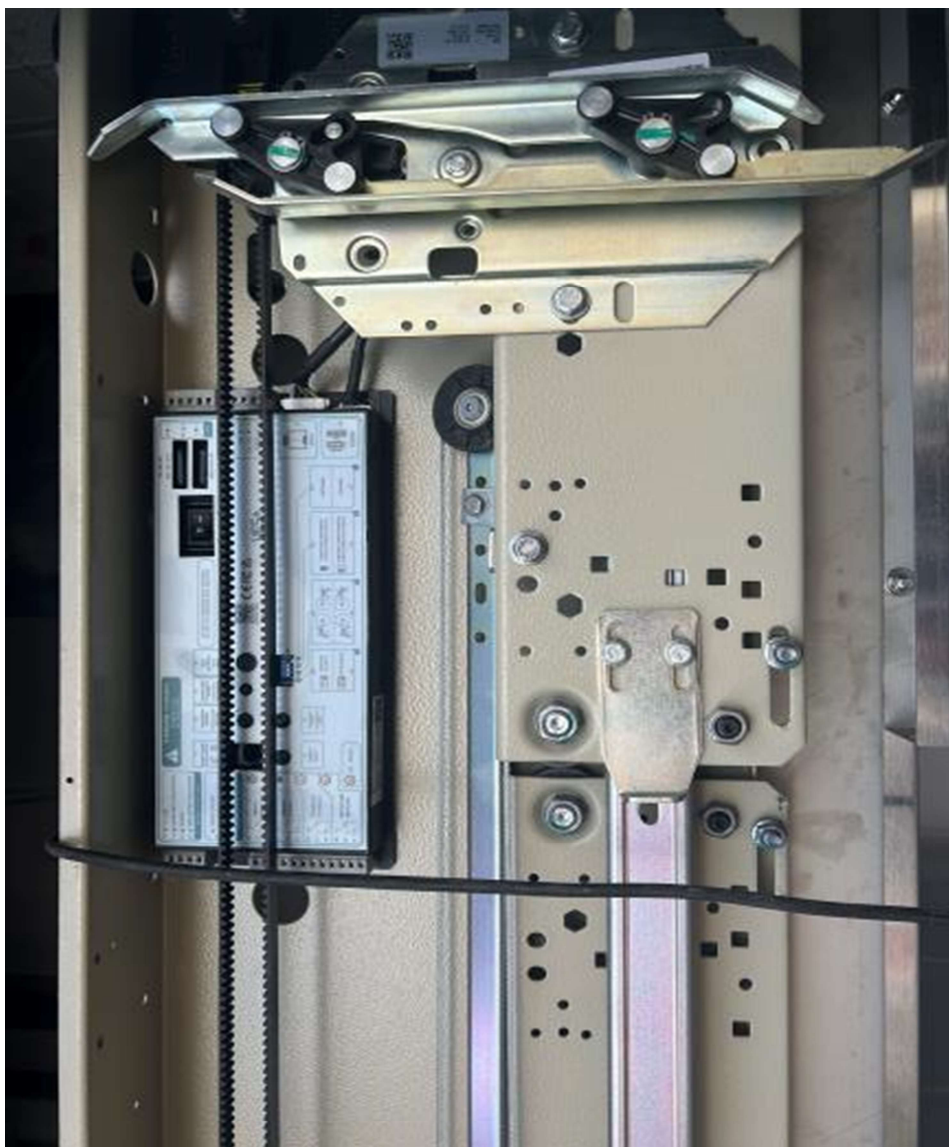



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - QGBT





Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

DETALHES DE MONTAGEM

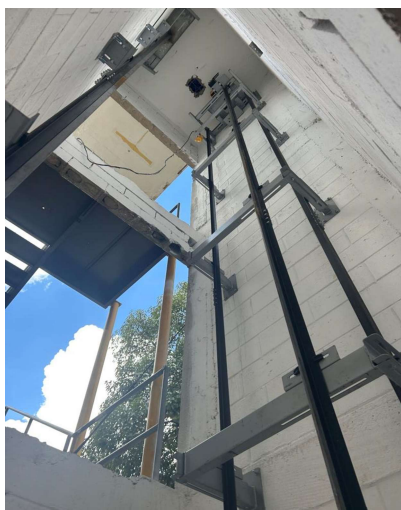



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



Faculdade de
Engenharia de
Alimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Contratação de empresa especializada para modernização do equipamento de transporte vertical de Pessoas (elevador) do prédio do Laboratório de Bioaromas/DECAN/FEA

EMPRESA: Metalúrgica Ascurra Ltda

DATA: 04/2025

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CIVIS (TRATAMENTO E PINTURA) E DAS INFRAESTRUTURAS

